【令和7年発生災害　第1次査定】 査定期間:令和7年5月22日～23日

工事番号	事務所名	河川名、海岸名、路線名等	位置			決定概要	異常気象
			郡市	町村	大字		
1	上越東	主要地方道 上越安塚柏崎線	上越市	大島区	板山	復旧延長　L=37.9m 道路幅員　W=6.5～6.7(8.1～9.0)m 多数アンカー式補強土壁工 H=1.98～6.26m、A=95m2 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　A=200m2 防護柵基礎工 L=28.0m 防護柵工(ガードケーブル)L=37.0m	25075 2/26 融雪

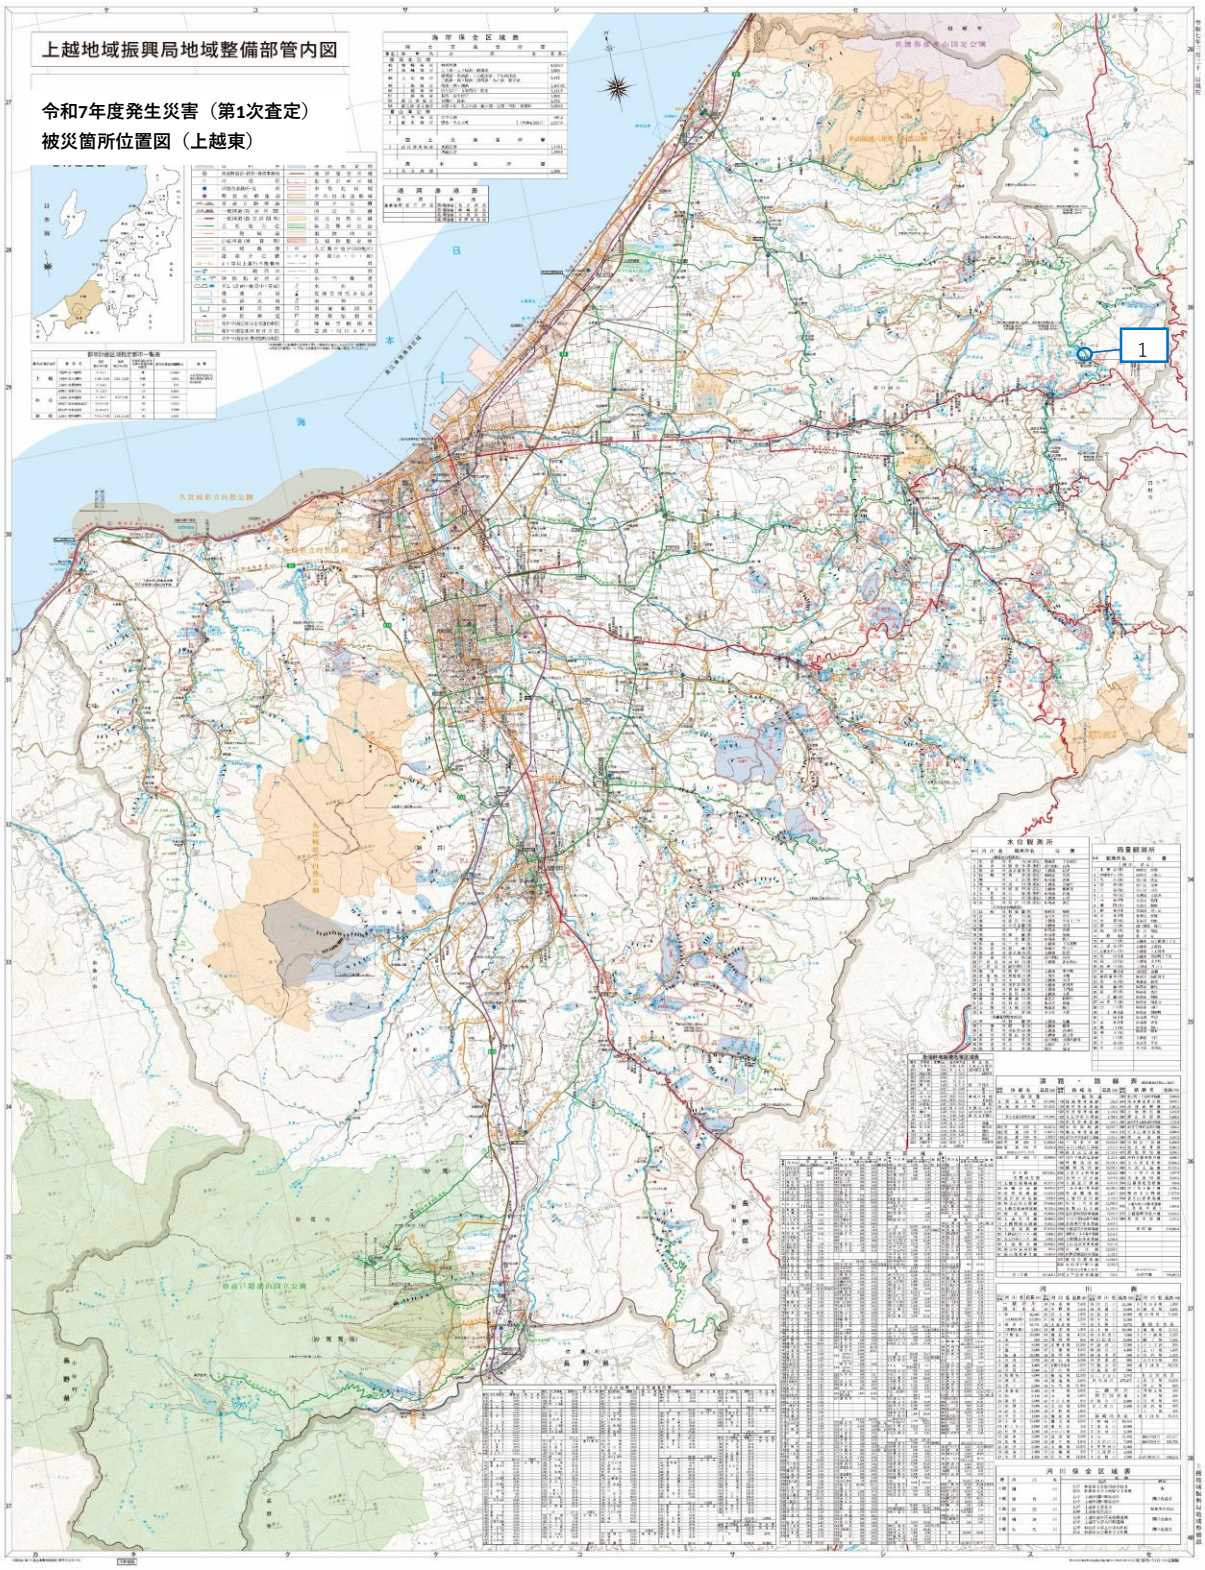
上越地域振興局地域整備部管内図
令和7年度発生災害（第1次査定）
被災箇所位置図（上越東）
1
